Planning contractuel

Projet maison "de la Motte" A Castex

Janvier 2026
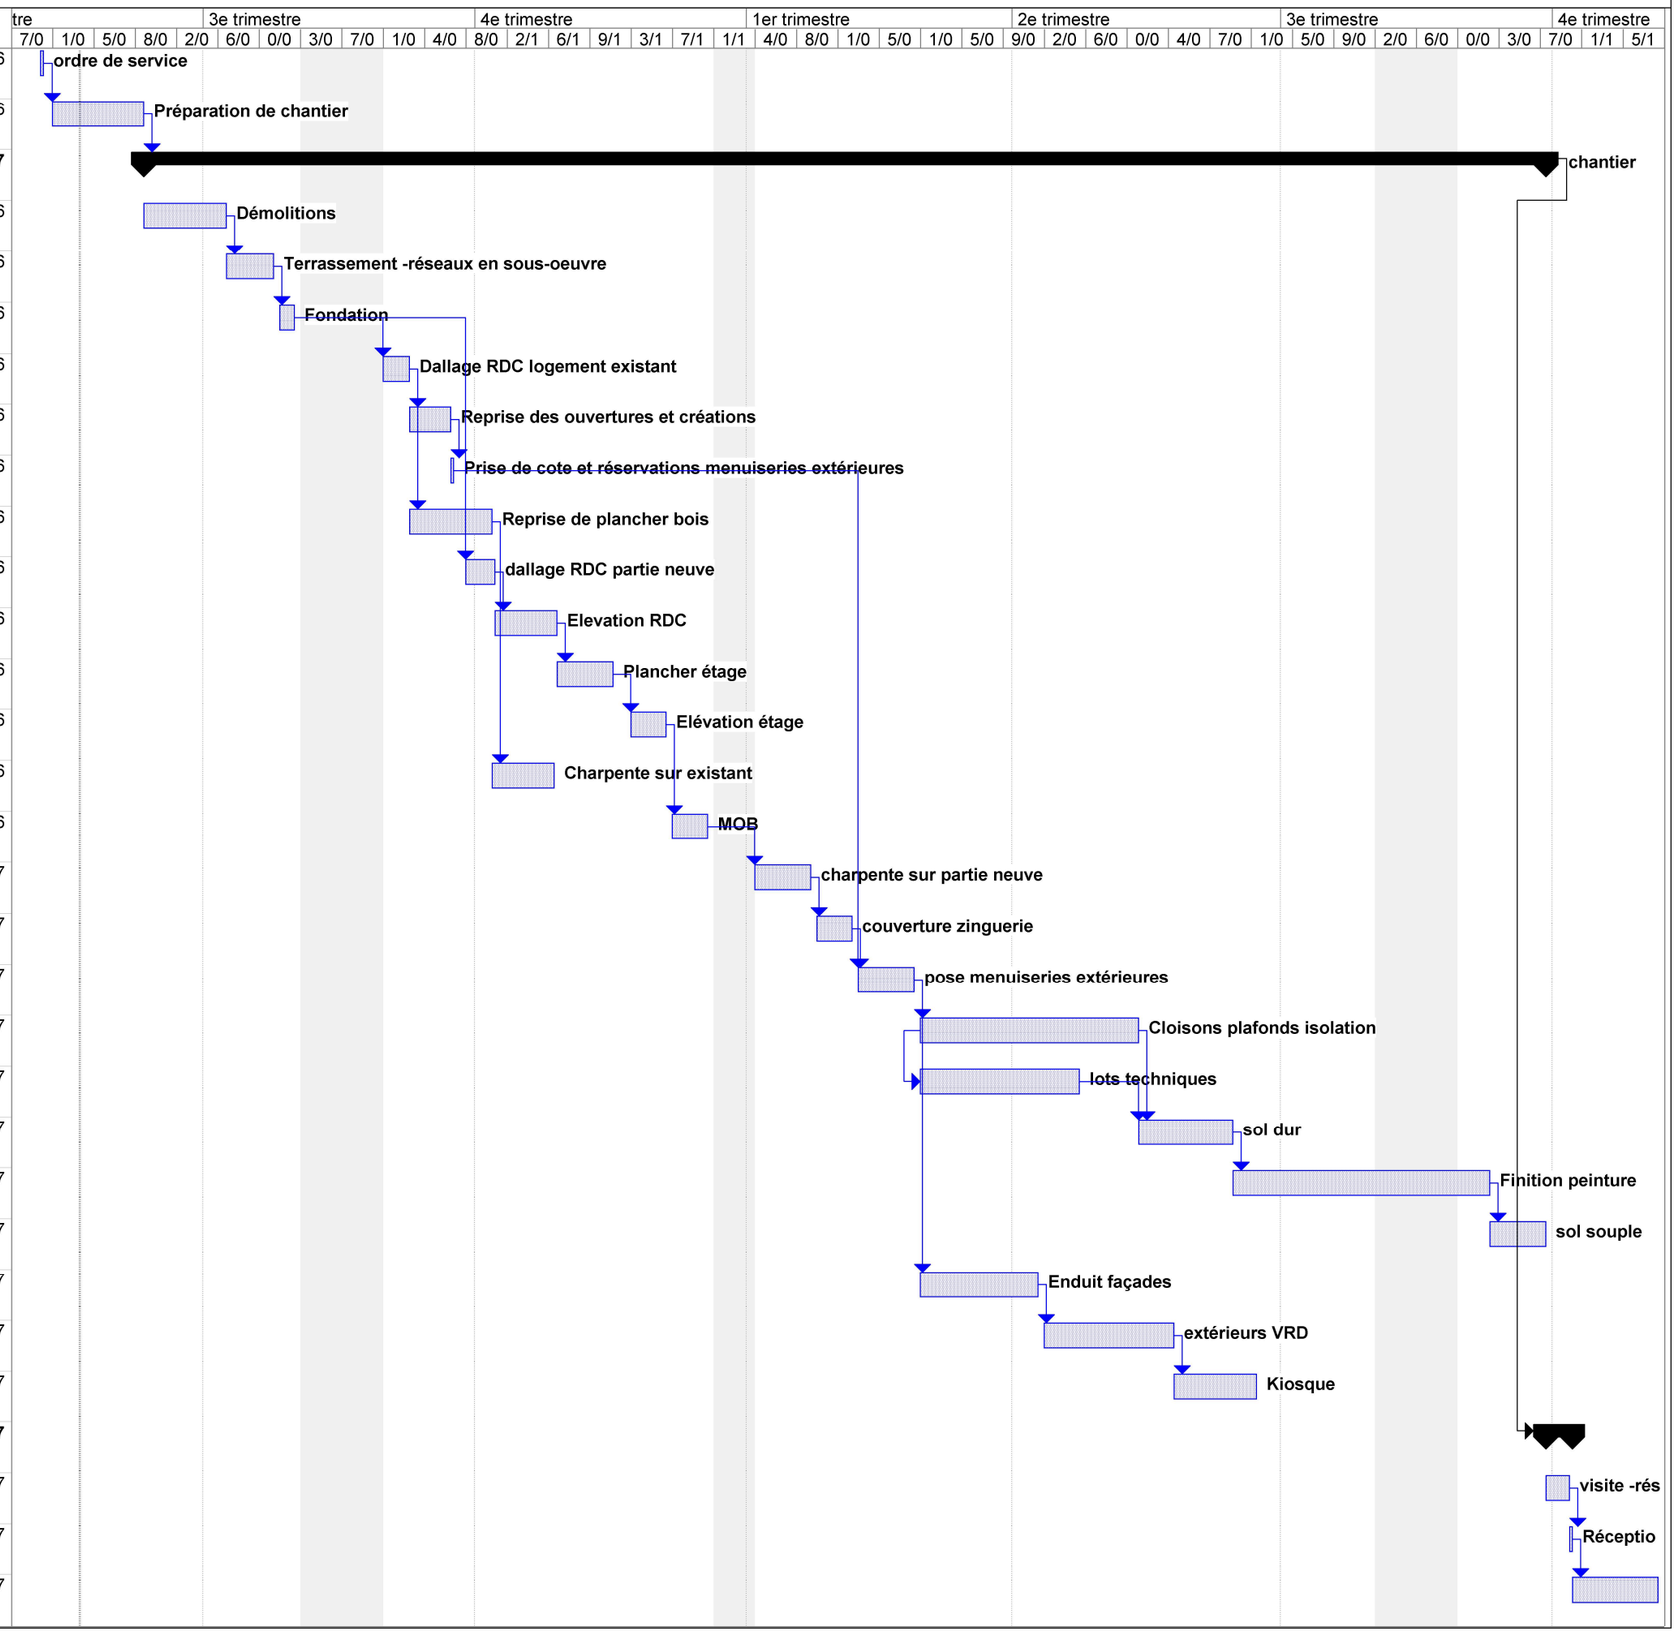
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	ordre de service	1 jour	Jeu 07/05/26	Jeu 07/05/26
2	Préparation de chantier	20 jours	Lun 11/05/26	Mer 10/06/26
3	**chantier**	**279 jours**	**Jeu 11/06/26**	**Mar 28/09/27**
4	Démolitions	20 jours	Jeu 11/06/26	Mer 08/07/26
5	Terrassement -réseaux en	10 jours	Jeu 09/07/26	Ven 24/07/26
6	Fondation	5 jours	Lun 27/07/26	Ven 31/07/26
7	Dallage RDC logement exi:	7 jours	Lun 31/08/26	Mar 08/09/26
8	Reprise des ouvertures et	10 jours	Mer 09/09/26	Mar 22/09/26
9	Prise de cote et réservatio	1 jour	Mer 23/09/26	Mer 23/09/26
10	Reprise de plancher bois	20 jours	Mer 09/09/26	Mar 06/10/26
11	dallage RDC partie neuve	8 jours	Lun 28/09/26	Mer 07/10/26
12	Elevation RDC	15 jours	Jeu 08/10/26	Mer 28/10/26
13	Plancher étage	10 jours	Jeu 29/10/26	Lun 16/11/26
14	Elévation étage	10 jours	Lun 23/11/26	Ven 04/12/26
15	Charpente sur existant	15 jours	Mer 07/10/26	Mar 27/10/26
16	MOB	10 jours	Lun 07/12/26	Ven 18/12/26
17	charpente sur partie neuve	15 jours	Lun 04/01/27	Ven 22/01/27
18	couverture zinguerie	10 jours	Lun 25/01/27	Ven 05/02/27
19	pose menuiseries extérieu	15 jours	Lun 08/02/27	Ven 26/02/27
20	Cloisons plafonds isolation	54 jours	Lun 01/03/27	Jeu 13/05/27
21	lots techniques	40 jours	Lun 01/03/27	Ven 23/04/27
22	sol dur	20 jours	Ven 14/05/27	Lun 14/06/27
23	Finition peinture	40 jours	Mar 15/06/27	Jeu 09/09/27
24	sol souple	13 jours	Ven 10/09/27	Mar 28/09/27
25	Enduit façades	30 jours	Lun 01/03/27	Ven 09/04/27
26	extérieurs VRD	30 jours	Lun 12/04/27	Mar 25/05/27
27	Kiosque	20 jours	Mer 26/05/27	Mar 22/06/27
28	**OPR**	**7 jours**	**Mer 29/09/27**	**Jeu 07/10/27**
29	visite -réserves-levées	6 jours	Mer 29/09/27	Mer 06/10/27
30	Réception	1 jour	Jeu 07/10/27	Jeu 07/10/27
31	DOE	20 jours	Ven 08/10/27	Ven 05/11/27
